

Thời gian sắp tới, hệ thống quản lý thuế TNCN sẽ được triển khai thí điểm tại một số Cục Thuế. Từ đó đến khi ứng dụng được triển khai rộng khắp cả nước không còn xa. Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2010, toàn bộ dự án Quản lý thuế TNCN (PIT) đã dồn lực chuẩn bị cho công tác triển khai thí điểm, đào tạo người sử dụng và triển khai toàn quốc.



Dự án PIT và giai đoạn triển khai mở rộng

NGUYỄN VĂN

Kết quả sau 16 tháng thực hiện dự án

Dự án PIT được triển khai từ đầu tháng 1/2009 và đã trải qua các giai đoạn lập kế hoạch, phân tích, thiết kế, xây dựng và tích hợp, kiểm thử. Đến nay, 135 chức năng thuộc 4 phân hệ của hệ thống quản lý thuế TNCN đã được hoàn thành, bao gồm phân hệ đăng ký thuế; xử lý tờ khai, quản lý nợ và kế toán thuế. Cơ chế bảo mật phân quyền cho mỗi chức năng đến nay cũng đã được xác lập. Ngoài các chức năng trong hệ thống quản lý thuế TNCN, dự án PIT cũng đã xây dựng hệ thống đăng ký mã số thuế và ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế 2009. Hai ứng dụng này đã và đang góp phần đẩy mạnh việc triển khai Luật Thuế TNCN.


Hệ thống quản lý thuế TNCN cũng đã trải qua giai đoạn kiểm thử, nghiệm thu mức người dùng lần thứ nhất vào tháng 1/2010, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi ngôn ngữ người sử dụng sang tiếng Việt. Qua đợt kiểm thử này, người sử

dụng (là đại diện của một số Cục Thuế như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Nai...) đánh giá, hệ thống quản lý thuế TNCN (PITMS) với các tính năng linh hoạt, hiện đại và dễ sử dụng, có thể đáp ứng tốt việc hỗ trợ cơ quan thuế trong công tác quản lý thuế TNCN.

Triển khai - Đường tới đích không còn xa

Thời gian sắp tới, hệ thống quản lý thuế TNCN sẽ được triển khai thí điểm tại một số Cục Thuế. Từ đó đến khi ứng dụng được triển khai rộng khắp cả nước không còn xa. Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2010, toàn bộ dự án

Nội dung các bước mở rộng triển khai ứng dụng

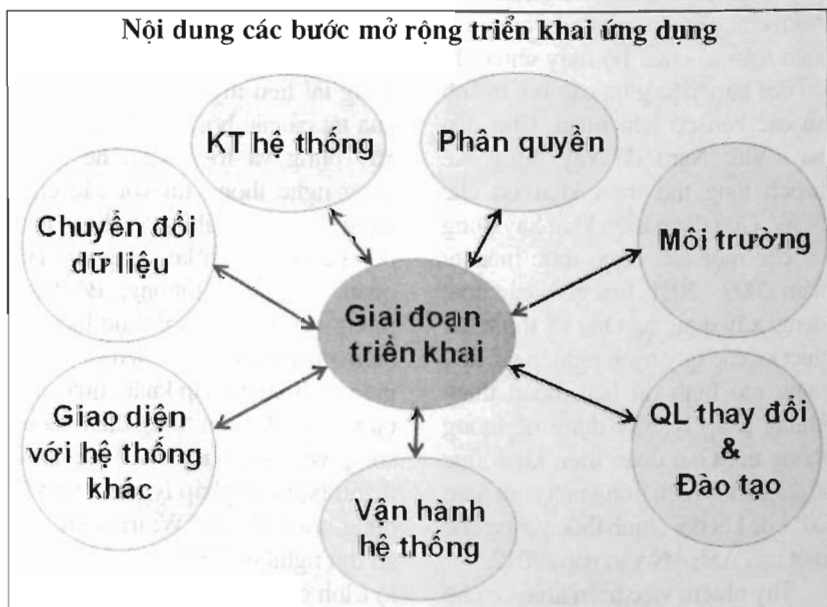



Các chuyên gia dự án PIT họp bàn kế hoạch mở rộng triển khai ứng dụng Ảnh: PV

quản lý thuế TNCN đang dồn lực chuẩn bị cho công tác triển khai thí điểm, đào tạo người sử dụng và triển khai toàn quốc. Công tác chuẩn bị được chia thành các nội dung công việc: chuẩn bị môi trường triển khai; chuyển đổi dữ liệu; mở giao diện với hệ thống khác; chuẩn bị tài liệu đào tạo.

Các nội dung công việc trong giai đoạn triển khai

Dự án đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị môi trường triển khai như sau: Tại Tổng cục Thuế, bao gồm các phần việc cài đặt môi trường phần cứng, chuẩn bị điều kiện hạ tầng, cài đặt hệ thống. Tại các điểm triển khai thuộc các Cục Thuế và Chi cục Thuế sẽ cài đặt và cấu hình hệ thống máy trạm, kiểm tra, nâng cấp hạ tầng đường truyền và môi trường phục vụ chuyển đổi dữ liệu, môi trường phục vụ đào tạo. Hệ thống sau khi được cài đặt sẽ được tạo các tài khoản và gán các dữ liệu phân quyền cho người sử dụng tại 700 điểm triển khai. Dự án cũng đã có phương án cho việc chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống hiện tại vào hệ thống PIT, bao gồm chuyển đổi dữ liệu người nộp thuế từ hệ thống TINTC và chuyển đổi dữ liệu số

phát sinh, số nợ thừa và số còn phải nộp, chi tiết tờ khai 10 từ các ứng dụng QLT, QCT, VATCC cho 63 Cục Thuế và hơn 700 Chi cục Thuế.

Việc thiết lập giao diện với các hệ thống TINTC và với kho bạc được dự kiến như sau: Giao diện với hệ thống TINTC sẽ được mở sau thời điểm chuyển đổi dữ liệu NNT để đồng bộ dữ liệu đăng ký thuế sang hệ thống PITMS; Giao diện với kho bạc sẽ được mở với từng tỉnh tại thời điểm triển khai.

Hệ thống quản lý thuế TNCN là một hệ thống lớn, tích hợp với nhiều quy trình nghiệp vụ được đồng nhất trên một nền tảng và một hệ thống quy trình nghiệp vụ mới được ban hành, do đó công tác đào tạo để người sử dụng nắm được những thay đổi trong công việc, hiểu và sử dụng được những tính năng mới do hệ thống đem lại sẽ quyết định sự thành công của giai đoạn triển khai, cũng như sự thành công của dự án. Kế hoạch đào tạo người sử dụng trong dự án dự kiến sẽ được chia làm 03 giai đoạn chính: (1) Đào tạo cán bộ nguồn của TCT, các Cục Thuế và Chi cục Thuế, phục vụ cho giai đoạn triển khai rộng tiếp theo; (2)

Đào tạo trong quá trình triển khai; (3) Đào tạo & hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Hiện tại, nhóm đào tạo của dự án đang hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn sử dụng cho các quy trình đăng ký thuế, kế toán thuế, quản lý tuân thủ, xử lý tờ khai. Bộ tài liệu được viết dưới 3 hình thức: Word, tệp trình chiếu (slide) và Video. Tài liệu bằng video với phương thức ghi lại các thao tác sử dụng ứng dụng trên màn hình sẽ giúp cho việc hướng dẫn các cán bộ thuế trong đợt tập huấn trực quan hơn.

Song song với các luồng công việc mới, dự án cũng đã và đang triển khai mảng việc quản lý chuyển đổi, trong đó, việc truyền thông tới các cán bộ thuế đang được đẩy mạnh. Dự kiến, trong các lớp đào tạo Keyuser (người sử dụng chính), dự án sẽ xây dựng mạng lưới quản lý sự thay đổi trong ngành thuế nhằm giúp việc hỗ trợ NSD hệ thống được thông suốt sau khi ứng dụng đã được triển khai xong.

Cũng theo kế hoạch dự án, vào cuối tháng 5 đầu tháng 6/2010, dự án sẽ tiến hành triển khai thí điểm hệ thống quản lý thuế TNCN tại một số Cục Thuế, nhằm đánh giá một cách tổng thể phương án và các quy trình triển khai đã được xây dựng. Kết quả quá trình triển khai thí điểm sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá và hoàn thiện các quy trình triển khai sẽ được sử dụng khi dự án bước vào giai đoạn triển khai rộng ■

Chú thích
Hệ thống TINTC: Đăng ký MST cấp Tổng cục Thuế
Ứng dụng QLT: Hệ thống quản lý thuế
Ứng dụng QCT: Hệ thống quản lý hộ cá thể tại Chi cục Thuế
Ứng dụng VATCC: Hệ thống quản lý thuế VAT cấp Chi cục Thuế
